



*Loop Danışmanlık Grubu*  
*“Değişimin Katalizörü”*

LOOP AKADEMİ

# MİCROSOFT PROJECT 2016™ EĞİTİM İÇERİĞİ



## İLETİŞİM

Adres

Loop Danışmanlık Grubu

ST. PETERSBURG - MOSKOVA  
İSTANBUL - ANKARA

Tel | Fax | E-mail

Tel (Türkiye)

Tel (Rusya Federasyonu)

E-mail

Websitesi

:

:

:

:

+ 90 533 351 52 50

+ 7 931 315 10 35

info@loopcongroup.com

www.loopcongroup.com

# MİCROSOFT PROJECT 2016™ YAZILIMI EĞİTİM İÇERİĞİ

 *Loop Akademi*

*Loop Danışmanlık Grubu*  
*“Değişimin Katalizörü”*

---

# EĞİTİM İÇERİĞİ

## İÇERİK

1. GÜN - BÖLÜM 01

**01** İŞ PROGRAMINI  
GELİŞTİRMEK VE  
YÖNETMEK

2. GÜN - BÖLÜM 04

**04** MICROSOFT  
PROJECT 2016™  
PROGRAMINI  
KULLANARAK  
PLANLAMA

1. GÜN - BÖLÜM 02

**02** MICROSOFT  
PROJECT 2016™  
PROGRAMINI  
KULLANARAK

3. GÜN - BÖLÜM 05

**05** İŞ PROGRAMININ  
ÖNEMİ & ÖĞRENİLMİŞ  
DERSLER

2. GÜN - BÖLÜM 03

**03** MICROSOFT  
PROJECT 2016™  
PROGRAMINI  
KULLANARAK  
PLANLAMA

3. GÜN - BÖLÜM 06

**06** SORULAR & CEVAPLAR  
EĞİTİM SINAVI  
SINAV SONUÇLARININ  
VE EĞİTİMİN  
DEĞERLENDİRİLMESİ

01

BÖLÜM 01  
İŞ PROGRAMINI  
GELİŞTİRMEK VE  
YÖNETMEK


02

BÖLÜM 02  
MICROSOFT PROJECT  
2016™ PROGRAMINI  
KULLANARAK  
PLANLAMA

03

BÖLÜM 03  
MICROSOFT PROJECT  
2016™ PROGRAMINI  
KULLANARAK PLANLAMA

“Biz; KULLANILABİLİRLİK, İŞLEVSELLİK ve MÜKEMMEL ETKİLER  
getiren ÇÖZÜMLER sağlıyoruz”.

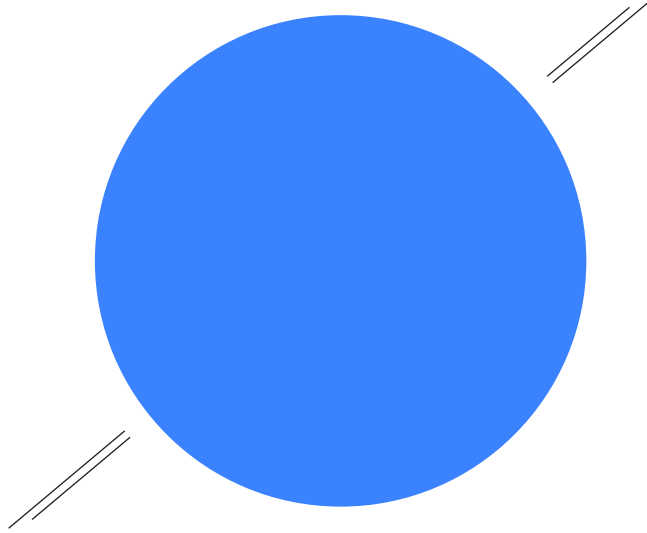

# 04

BÖLÜM 04  
MICROSOFT PROJECT  
2016™ PROGRAMINI  
KULLANARAK  
PLANLAMA

# 05

BÖLÜM 05  
İŞ PROGRAMININ ÖNEMİ  
VE ÖÇRENİLMİŞ DERSLER

# 06

BÖLÜM 06  
SORULAR & CEVAPLAR  
EĞİTİM SINAVI  
SINAV SONUÇLARININ VE  
EĞİTİMİN

“Parlak bir GELECEK için GÜÇLÜ TEMELLER”.

## EĞİTİMİN HEDEFLERİ VE ÖZETİ

### EĞİTİM ÖZETLERİ

- Proaktif Zamanlama Yönetimi,
- Proje Kaynaklarının (İşgücü, Ekipman Gücü ve Malzeme) Planlanması,
- İnşaat İş Programlarının Geliştirilmesi,
- Hedef ve Güncel İş Programlarının Karşılaştırılması,
- Kazanılmış Değer Analizi (EVA) ve İş Programı Performans İndeksinin (SPI) Hesaplanması,
- Gecikme Analizi ve Prosedürler,

### İNŞAAT İŞ PROGRAMI VE GECİKME HAK ANALİZLERİNİ ÖĞRENMEDE Kİ HEDEFLER

- Uygun Bir İş Programının Anlamı ve Önemi İle İlgili Bilgiler,
- Kullanışlı Bir İş Programının İpuçları ve Teknikleri,
- Gecikme Analizleri İle İlgili Bilmeniz Gerekenler,
- Bir Projede ki Gizli Tuzakları, Anlaşmazlıkları, Problemleri Önlemek ve Belirlemek İçin İnşaat Dökümanlarını Kullanmanın İpuçları,
- Hak Taleplerinin Temellerinin ve Kanıtlarının Oluşturulması,

### OLASI DEVAM EDEN EĞİTİM KREDİSİ,

- PMI 6.0,
- IACET 0.6,
- IPMA,
- AIA 6.0,

### KİMLER KATILMALI?

- Bu üç günlük eğitim proje müdürleri, yükleniciler, altyükleniciler, yatırımcılar, mühendisler, mimarlar, sözleşme yöneticileri & geliştiricileri ve inşaat iş programlarını nasıl okumak ve anlamak gerektiği üzerine bir eğitim almak isteyen ve inşaat sektöründe görev yapan diğer profesyoneller için tasarlanmıştır.

01

BÖLÜM 01  
İŞ PROGRAMINI  
GELİŞTİRMEK VE  
YÖNETMEK

02

BÖLÜM 02  
MICROSOFT PROJECT  
2016™ PROGRAMINI  
KULLANARAK  
PLANLAMA

03

BÖLÜM 03  
MICROSOFT PROJECT  
2016™ PROGRAMINI  
KULLANARAK  
PLANLAMA

“LOOP AKADEMİ; 3 Kıta, 14 Ülke ve Toplam Değeri 25 Milyar USD’yi aşkın Sözleşme de PROJE YÖNETİMİ Desteği”.

## BÖLÜM 01

### İŞ PROGRAMINI GELİŞTİRMEK & YÖNETMEK

- 1 Kullanışlı Bir Proje Yönetim Aracı Olarak İş Programı,
- 2 İş Programının Temelleri,
  - Aktivite Özellikleri ve İlişkileri,
  - Kritik Yol Yöntemi İş Programı,
  - İş Programı Güncellemeleri ve Revizyonları,
- 3 Yararlı Bir İş Programı İpuçları ve Teknikleri,

## BÖLÜM 02

### MICROSOFT PROJECT 2016™ PROGRAMINI KULLANARAK PLANLAMA

- 1 Yeni bir Proje Tanımlamak,
- 2 Proje ve Kaynak Takvimi Gibi Kullanıcı Parametrelerinin Düzenlenmesi,
- 3 Hedef İş Programının Oluşturulması,
  - İş Kırılım Yapısının Oluşturulması,
  - Aktivite Listesinin Oluşturulması,
  - Tahmin Metodları,
  - Aktivite Süre Tahminlerinin Tamamlanması,
  - Mantıksal Sıralama (Hard Logic, Soft Logic Yaklaşımı),
  - Sözleşmede ki Süre Kısıtlamaları,
  - Kritik Aktivitelerin ve Kritik Yol’un Belirlenmesi ve Yorumlanması,
  - Toplam Bolluk Yönetimi ve Önemi,
  - Filtreleme Seçeneklerinin Aktif Kullanımı,
- 4 Yararlı Bir İş Programı Teknikleri ve İpuçları,

**04** BÖLÜM 04  
MICROSOFT PROJECT  
2016™ PROGRAMINI  
KULLANARAK  
PLANLAMA

**05** BÖLÜM 05  
İŞ PROGRAMININ ÖNEMİ  
VE ÖÇRENİLMİŞ DERSLER

**06** BÖLÜM 06  
SORULAR & CEVAPLAR  
EĞİTİM SINAVI  
SINAV SONUÇLARININ VE  
EĞİTİMİN

“Geleceği İLERİCİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE inşa etmek”.

## BÖLÜM 03

# MICROSOFT PROJECT 2016™ PROGRAMINI KULLANARAK PLANLAMA

→ Hedef İş Programının Geliştirilmesi,

- Adam-saat ve Ekipman-saat Tahminlerinin Yapılması,
- Kaynak Veri Havuzunun Oluşturulması,
- Aktivite Kaynak Atamalarının Yapılması,
- Maliyet Kırılım Yapısının Oluşturulması,
- Maliyet Kodlama sisteminin Oluşturulması,
- MS Excel İle Veri Alış Verişinin Yapılması,
- Microsoft Project 2016™ da Export ve İmport,
- Gantt Chart Ayarları,
- Kaynakların Optimizasyonu,
- Kaynak Dağılım Raporlarının Alınması ve Yorumlanması,
- Maliyet Dağılım Raporunun Alınması ve Yorumlanması,
- Kaynak Grafik Raporlarının Alınması ve Yorumlanması,
- Maliyet Grafik Raporlarının Alınması ve Yorumlanması,

## BÖLÜM 04

# MICROSOFT PROJECT 2016™ PROGRAMINI KULLANARAK PLANLAMA

→ Hedef İş Programının Güncellenmesi ve Revizyonu,

- Proje ve/veya Aktivite İlerleme Tipleri,
- İş Programının Periyodik Olarak Güncellenmesi ve Önemi,
- İş Programı Performans İndeksinin (SPI) Hesaplanması,
- Kazanılmış Değer Analizi (EVA),
- Periyodik İlerleme Raporlarının Alınması,
- Hakedişe Esas Teşkil Edecek İlerleme Raporlarının Alınması,
- Süresel Sapmaların Hesaplanması ve Gecikme Analizleri,
- Hedef Bütçe İle Gerçekleşen Bütçe Karşılaştırması,
- İş Programı Raporunun Alınması ve Yorumlanması,
- Proje Performansının Belirlemek İçin Raporlama Teknikleri,

04

BÖLÜM 04  
MICROSOFT PROJECT  
2016™ PROGRAMINI  
KULLANARAK  
PLANLAMA

05

BÖLÜM 05  
İŞ PROGRAMININ ÖNEMİ  
VE ÖĞRENİLMİŞ DERSLER

06

BÖLÜM 06  
SORULAR & CEVAPLAR  
EĞİTİM SINAVI  
SINAV SONUÇLARININ VE  
EĞİTİMİN

“LOOP DANIŞMANLIK GRUBU; Değişimin Katalizörü”.

## BÖLÜM 05

### İŞ PROGRAMININ ÖNEMİ VE ÖĞRENİLMİŞ DERSLER

- 1 Bir Sözleşme Dökümanı Olarak İş Programı,
- 2 Büyük Çaplı Projelerin İş Programlarının İncelenmesi,
- 3 Öğrenilmiş Dersler ve Tecrübelerin Paylaşımı,
- 4 İş Programı İle İlgili Diğer Hususlar,

## BÖLÜM 06

### EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- 1 Sorular ve Cevaplar,
- 2 Eğitim Sınavı,
- 3 Sınav Sonuçlarının ve Eğitimin Değerlendirilmesi & Katılım Sertifikalarının Sunulması,



Loop Akademi



Loop Danışmanlık Grubu  
“Değişimin Katalizörü”

---

# İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!

Loop Akademi tarafından düzenlenen “İş Programı ve Microsoft Project 2016™ yazılımının inşaat projelerin de etkin kullanımı” hakkında ki eğitimlerimize katılmak, eğitim detayları ve takvimi hakkında bilgi almak için burayı tıklayabilir yada bizi arayabilirsiniz. Eğitim ön talep formunu burayı tıklayarak doldurabilir, gönder butonuna basarak tarafımıza iletebilirsiniz.

## İLETİŞİM

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz:

Loop Danışmanlık Grubu

W: [www.loopcongroup.com](http://www.loopcongroup.com)

E: [info@loopcongroup.com](mailto:info@loopcongroup.com)

P: +90 533 351 52 50

P: + 7 931 315 10 35
