

MICROSOFT PROJECT 2016™ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ



Консалтинговая Группа Loop
“Катализатор перемен”

АКАДЕМИЯ LOOP

MICROSOFT PROJECT 2016™ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ



КОНТАКТ

Адрес

Консалтинговая Группа Loop
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МОСКВА
СТАМБУЛ - АНКАРА

Телефон | Факс | Эл. почта

| | | |
|------------------|---|-----------------------|
| Телефон (Турция) | : | + 90 533 351 52 50 |
| Телефон (Россия) | : | + 7 931 315 10 35 |
| Эл. адрес | : | info@loopcongroup.com |
| Веб-сайт | : | www.loopcongroup.com |

MICROSOFT PROJECT 2016™ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ



● Академия Loop

Консалтинговая Группа Loop
“Катализатор перемен”



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА



СОДЕРЖАНИЕ

1-Й ДЕНЬ - РАЗДЕЛ 01

01

РАЗВИВАТЬ
И УПРАВЛЯТЬ
БИЗНЕС-ПРОГРАММОЙ

2-Й ДЕНЬ - РАЗДЕЛ 04

04

ПЛАНИРОВАНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ MICROSOFT
PROJECT 2016™

1-Й ДЕНЬ - РАЗДЕЛ 02

02

ПЛАНИРОВАНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ MICROSOFT
PROJECT 2016™

3-Й ДЕНЬ - РАЗДЕЛ 05

05

ЗНАЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ РАБОТЫ
И ИЗВЛЕЧЕННЫЕ
УРОКИ

2-Й ДЕНЬ - РАЗДЕЛ 03

03

ПЛАНИРОВАНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ MICROSOFT
PROJECT 2016™

3-Й ДЕНЬ - РАЗДЕЛ 06

06

ВОПРОС и ОТВЕТ,
УЧЕБНЫЙ ЭКЗАМЕН,
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭКЗАМЕНА И ТРЕНИНГА

01

РАЗДЕЛ 01
РАЗВИВАТЬ
И УПРАВЛЯТЬ
БИЗНЕС-ПРОГРАММОЙ


02

РАЗДЕЛ 02
ПЛАНИРОВАНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
MICROSOFT PROJECT 2016™

03

РАЗДЕЛ 03
ПЛАНИРОВАНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
MICROSOFT PROJECT 2016™

“Консалтинговая Группа Loop – обеспечит УДОБСТВО, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
и РЕШЕНИЯ, которые приведут к СОВЕРШЕННОМУ ЭФФЕКТУ”.

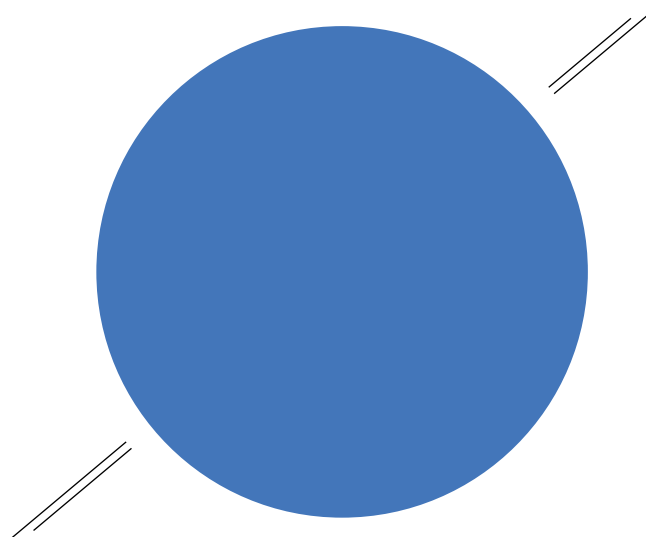

“МОЩНАЯ ОСНОВА для блестящего БУДУЩЕГО”.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ТРЕНИНГА

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА,

- Проактивное управление временем,
- Планирование ресурсов проекта (рабочая сила, сила оборудования и материалы),
- Разработка программы работ строительства,
- Сравнение целевой и текущей программы работ,
- Анализ добавленной стоимости (EVA) и расчет индекса эффективности рабочей программы (SPI),
- Процедуры и анализы задержек,

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И АНАЛИЗА ЗАДЕРЖЕК,

- Информация о значении и важности подходящей рабочей программы,
- Подсказки и методы удобной бизнес-программы,
- Что вам нужно знать об анализах задержки,
- Подсказки по использованию строительных документов, для предотвращения и выявления скрытых ловушек, конфликтов, проблем проекта,
- Создание основ и доказательств требований прав,

ВЕРОЯТНЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ,

- PMI 6.0,
- IACET 0.6,
- IPMA,
- AIA 6.0,

КТО ДОЛЖЕН УЧАСТВОВАТЬ?

- Этот трехдневный тренинг был разработан для руководителей проектов, подрядчиков, субподрядчиков, инвесторов, инженеров, архитекторов, менеджеров&разработчиков контрактов и других специалистов, работающих в строительной отрасли, которые хотят научиться читать и понимать строительные рабочие программы.

01

РАЗДЕЛ 01
РАЗВИВАТЬ
И УПРАВЛЯТЬ
БИЗНЕС-
ПРОГРАММОЙ

02

РАЗДЕЛ 02
ПЛАНИРОВАНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
MICROSOFT PROJECT 2016™

03

РАЗДЕЛ 03
ПЛАНИРОВАНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
MICROSOFT PROJECT 2016™

“АКАДЕМИЯ LOOP предоставляем «УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ» проектам на 3-х континентах и в 14 странах, 5 Мега Проектам, общей стоимостью контрактов более чем в 25 миллиардов долларов США”.

РАЗДЕЛ 01

РАЗВИВАТЬ И УПРАВЛЯТЬ БИЗНЕС-ПРОГРАММОЙ

1 Бизнес-программа как удобный инструмент управления проектами,

2 Основы бизнес-программы,

- Свойства и отношения деятельности,
- Бизнес-программа метод критического пути,
- Обновления и изменения бизнес-программы,

3 Методы и подсказки полезной бизнес-

РАЗДЕЛ 02

ПЛАНИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MICROSOFT PROJECT 2016™

1 Определение нового проекта,

2 Регулирование пользовательских параметров, таких как расписание проекта и ресурсов,

3 Создание целевой бизнес-программы,

- Создание структуры разбивки работ,
- Создание списка активности,
- Методы прогноза,
- Завершение прогнозов срока деятельности,
- Логическая последовательность (Подход Hard Logic, Soft Logic),
- Временные ограничения в контракте,
- Определение и интерпретация критической деятельности и критических путей,
- Значение и управление общим резервом,
- Использование параметров активной фильтрации

4 Методы и подсказки полезной бизнес-программы,

04 РАЗДЕЛ 04
ПЛАНИРОВАНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
MICROSOFT PROJECT 2016™

05 РАЗДЕЛ 05
ЗНАЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ РАБОТЫ И
ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

06 РАЗДЕЛ 06
ВОПРОС и ОТВЕТ,
УЧЕБНЫЙ ЭКЗАМЕН,
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭКЗАМЕНА И ТРЕНИНГА

“Строить будущее с УСТОЙЧИВОЙ ПРОГРЕССИВНОСТЬЮ”.

РАЗДЕЛ 03

ПЛАНИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MICROSOFT PROJECT 2016™

Развитие целевой бизнес-программы,

- Прогнозирование человеко/часов и оборудование/часов,
- Создание источника данных пула,
- Назначение источника деятельности,
- Создание структуры разбивки затрат,
- Создание системы кодирования затрат,
- Создание обмена данными с MS Excel,
- Экспорт и импорт в MS Project,
- Настройки Gantt Chart,
- Оптимизация активов,
- Приобретение и интерпретация отчета распределения ресурсов,
- Приобретение и интерпретация отчета распределения затрат,
- Приобретение и интерпретация исходных графических отчетов,
- Приобретение и интерпретация графических отчетов затрат,

РАЗДЕЛ 04

ПЛАНИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MICROSOFT PROJECT 2016™

Обновление и пересмотр целевой бизнес-программы,

- Проектные и/или деятельные прогрессивные команды,
- Периодическое обновление бизнес-программы и ее значение,
- Расчет индекса эффективности бизнес-программы (SPI),
- Анализ добавленной стоимости (EVA),
- Приобретение периодических отчетов о ходе работ,
- Приобретение периодических отчетов о ходе работ, организованных на основании сметы,
- Расчет периодических отклонений и анализы задержки,
- Сравнение реализованного бюджета с целевым бюджетом,
- Приобретение и интерпретация отчета бизнес-программы,
- Методы отчетности для определения эффективности проекта,

04 РАЗДЕЛ 04
ПЛАНИРОВАНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
MICROSOFT PROJECT 2016™

05 РАЗДЕЛ 05
ЗНАЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ РАБОТЫ И
ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

06 РАЗДЕЛ 06
ВОПРОС и ОТВЕТ,
УЧЕБНЫЙ ЭКЗАМЕН,
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭКЗАМЕНА И ТРЕНИНГА

“КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА LOOP; Катализатор перемен”.

РАЗДЕЛ 05

ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ И ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

- 1 Бизнес-программа как контрактный документ,
- 2 Анализ бизнес-программ крупных проектов,
- 3 Извлеченные уроки и обмен опытом,
- 4 Особенности, связанные с другой программой работы,

РАЗДЕЛ 06

ОЦЕНКА ТРЕНИНГА

- 1 Вопрос и ответ,
- 2 Учебный экзамен,
- 3 Оценка результатов экзамена и подача сертификатов участников,

Академия Loop



Консалтинговая Группа Loop
“Катализатор перемен”

СПАСИБО ЗА ВАШ ИНТЕРЕС!

Для получения информации о том, как принять участие в наших тренингах на тему «Методология планирования и эффективное использование программного обеспечения MS Projects в строительных проектах», а также деталях и расписании тренингов, проводимых Академией Loop, вы можете позвонить нам или кликнуть здесь. Кликнув здесь, вы можете заполнить форму предварительной заявки на проведение тренинга, затем отправить нам, нажатием кнопки - отправить.

КОНТАКТ

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Консалтинговая Группа Loop

В: www.loopcongroup.com

Э: info@loopcongroup.com

Т: +90 533 351 52 50

Т: + 7 931 315 10 35
